


| Id | Opgavenavn   | Faggruppe | Varighed        | Startdato          | Slutdato           | 09. mar 20 |   |   |   |   |   |   | 16. mar 20 |   |   |   |   |   |   | 23. mar 20 |   |   |   |   |   |   | 30. mar 20 |   |   |   |   |   |   | 06. apr 20 |   |   |   |   |   |   | 13. apr 20 |   |   |   |   |   |   | 20. apr 20 |   |   |   |   |   |   | 27. apr 20 |   |   |   |   |   |   | 04. maj 20 |   |   |   |   |   |   |
|----|--|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|    |  |           |                 |                    |                    | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t | f          | l | s | m | t | o | t |
| 1  | <b>Aladdin - dørudskiftning</b>  |           | <b>105 dage</b> | <b>ma 09-03-20</b> | <b>fr 31-07-20</b> |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Udskiftning af døre BRO11  | TØM       | 3 dage          | ma 09-03-20        | on 11-03-20        | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Malerarbejde BRO11   | MAL       | 2 dage          | ma 16-03-20        | ti 17-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 4  |  |           |                 |                    |                    |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Udskiftning af døre BUR01  | TØM       | 3 dage          | on 11-03-20        | fr 13-03-20        | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Udskiftning af døre BUR03  | TØM       | 3 dage          | ma 16-03-20        | on 18-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Malerarbejde BUR01   | MAL       | 3 dage          | ma 16-03-20        | on 18-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Malerarbejde BUR03   | MAL       | 3 dage          | ti 24-03-20        | to 26-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Udskiftning af døre BUR05  | TØM       | 3 dage          | on 18-03-20        | fr 20-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Udskiftning af døre BUR07  | TØM       | 3 dage          | ma 23-03-20        | on 25-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Malerarbejde BUR05   | MAL       | 3 dage          | ti 24-03-20        | to 26-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Malerarbejde BUR07   | MAL       | 3 dage          | ti 31-03-20        | to 02-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Udskiftning af døre BUR09  | TØM       | 3 dage          | on 25-03-20        | fr 27-03-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Udskiftning af døre BUR11  | TØM       | 3 dage          | ma 30-03-20        | on 01-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Malerarbejde BUR09   | MAL       | 3 dage          | ti 31-03-20        | to 02-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Malerarbejde BUR11   | MAL       | 2 dage          | ti 07-04-20        | on 08-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Udskiftning af døre BUR15  | TØM       | 3 dage          | on 01-04-20        | fr 03-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Malerarbejde BUR15   | MAL       | 2 dage          | ti 07-04-20        | on 08-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Udskiftning af døre BUR17  | TØM       | 3 dage          | ma 06-04-20        | on 08-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Udskiftning af døre BUR19  | TØM       | 3 dage          | ti 14-04-20        | to 16-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Malerarbejde BUR17   | MAL       | 3 dage          | ti 21-04-20        | to 23-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Malerarbejde BUR19   | MAL       | 3 dage          | ti 21-04-20        | to 23-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Udskiftning af døre BUR21  | TØM       | 3 dage          | on 15-04-20        | fr 17-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Udskiftning af døre BUR23  | TØM       | 3 dage          | ma 20-04-20        | on 22-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Malerarbejde BUR21   | MAL       | 4 dage          | ti 21-04-20        | fr 24-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Malerarbejde BUR23   | MAL       | 3 dage          | ti 28-04-20        | to 30-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Udskiftning af døre BUR25  | TØM       | 3 dage          | on 22-04-20        | fr 24-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Udskiftning af døre BUR27  | TØM       | 3 dage          | ma 27-04-20        | on 29-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Malerarbejde BUR25   | MAL       | 3 dage          | ti 28-04-20        | to 30-04-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 30 | Malerarbejde BUR27   | MAL       | 3 dage          | ti 05-05-20        | to 07-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 31 |  |           |                 |                    |                    |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 32 | Udskiftning af døre BOD10  | TØM       | 3 dage          | on 29-04-20        | fr 01-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 33 | Udskiftning af døre BOD08  | TØM       | 3 dage          | ma 04-05-20        | on 06-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Malerarbejde BOD10   | MAL       | 3 dage          | ti 05-05-20        | to 07-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 35 | Malerarbejde BOD08   | MAL       | 3 dage          | ti 12-05-20        | to 14-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 36 |  |           |                 |                    |                    |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 37 | Udskiftning af døre AND28  | TØM       | 3 dage          | on 06-05-20        | fr 08-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 38 | Udskiftning af døre AND26  | TØM       | 3 dage          | ma 11-05-20        | on 13-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 39 | Malerarbejde AND28   | MAL       | 3 dage          | ti 12-05-20        | to 14-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Malerarbejde AND26   | MAL       | 3 dage          | ti 19-05-20        | to 21-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 41 | Udskiftning af døre AND24  | TØM       | 3 dage          | on 13-05-20        | fr 15-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 42 | Udskiftning af døre AND22  | TØM       | 3 dage          | ma 18-05-20        | on 20-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 43 | Malerarbejde AND24   | MAL       | 3 dage          | ti 19-05-20        | to 21-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 44 | Malerarbejde AND22   | MAL       | 3 dage          | ti 26-05-20        | to 28-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 45 | Udskiftning af døre AND20  | TØM       | 3 dage          | on 20-05-20        | fr 22-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 46 | Udskiftning af døre AND18  | TØM       | 3 dage          | ma 25-05-20        | on 27-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 47 | Malerarbejde AND20   | MAL       | 3 dage          | ti 26-05-20        | to 28-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 48 | Malerarbejde AND18   | MAL       | 3 dage          | ti 02-06-20        | to 04-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 49 | Udskiftning af døre AND16  | TØM       | 3 dage          | on 27-05-20        | fr 29-05-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 50 | Malerarbejde AND 16  | MAL       | 3 dage          | ti 02-06-20        | to 04-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 51 | Udskiftning af døre AND10  | TØM       | 3 dage          | ti 02-06-20        | to 04-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 52 | Malerarbejde AND10   | MAL       | 3 dage          | ti 09-06-20        | to 11-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 53 | Udskiftning af døre AND08  | TØM       | 3 dage          | on 03-06-20        | fr 05-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 54 | Udskiftning af døre AND06  | TØM       | 3 dage          | ma 08-06-20        | on 10-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 55 | Malerarbejde AND08   | MAL       | 3 dage          | ti 09-06-20        | to 11-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 56 | Malerarbejde AND06   | MAL       | 3 dage          | ti 16-06-20        | to 18-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 57 | Udskiftning af døre AND04  | TØM       | 3 dage          | on 10-06-20        | fr 12-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 58 | Udskiftning af døre AND02  | TØM       | 3 dage          | ma 15-06-20        | on 17-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 59 | Malerarbejde AND04   | MAL       | 3 dage          | ti 16-06-20        | to 18-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 60 | Malerarbejde AND02   | MAL       | 3 dage          | ti 23-06-20        | to 25-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 61 |  |           |                 |                    |                    |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 62 | Udskiftning af døre BRO07  | TØM       | 3 dage          | on 17-06-20        | fr 19-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 63 | Udskiftning af døre BRO09  | TØM       | 3 dage          | ma 22-06-20        | on 24-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | TØM        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 64 | Malerarbejde BRO07   | MAL       | 3 dage          | ti 23-06-20        | to 25-06-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 65 | Malerarbejde BRO09   | MAL       | 3 dage          | ti 30-06-20        | to 02-07-20        |            |   |   |   |   |   |   | MAL        |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 66 | Der er afsat 4 uger extra i tidsplanen så afleveringsforretningen først er | Bygherre  | 1 dag           | ma 27-07-20        | ma 27-07-20        |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |

|  |          |  |                  |  |                 |  |                  |  |                            |  |              |  |               |  |
|--|----------|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Projekt: Tidsplan - Døre - 230320<br>Dato: ma 23-03-20 | Opgave   |  | Hovedopgave      |  | Ekstern milepæl |  | Inaktiv oversigt |  | Manuel oversigtsopløftning |  | Kun slutdato |  | Manuel status |  |
|  | Opdeling |  | Projektoversigt  |  | Inaktiv opgave  |  | Manuel opgave    |  | Manuel oversigt            |  | Deadline     |  |               |  |
|  | Milepæl  |  | Eksterne opgaver |  | Inaktiv milepæl |  | Kun varighed     |  | kun start                  |  | Fremdrift    |  |               |  |

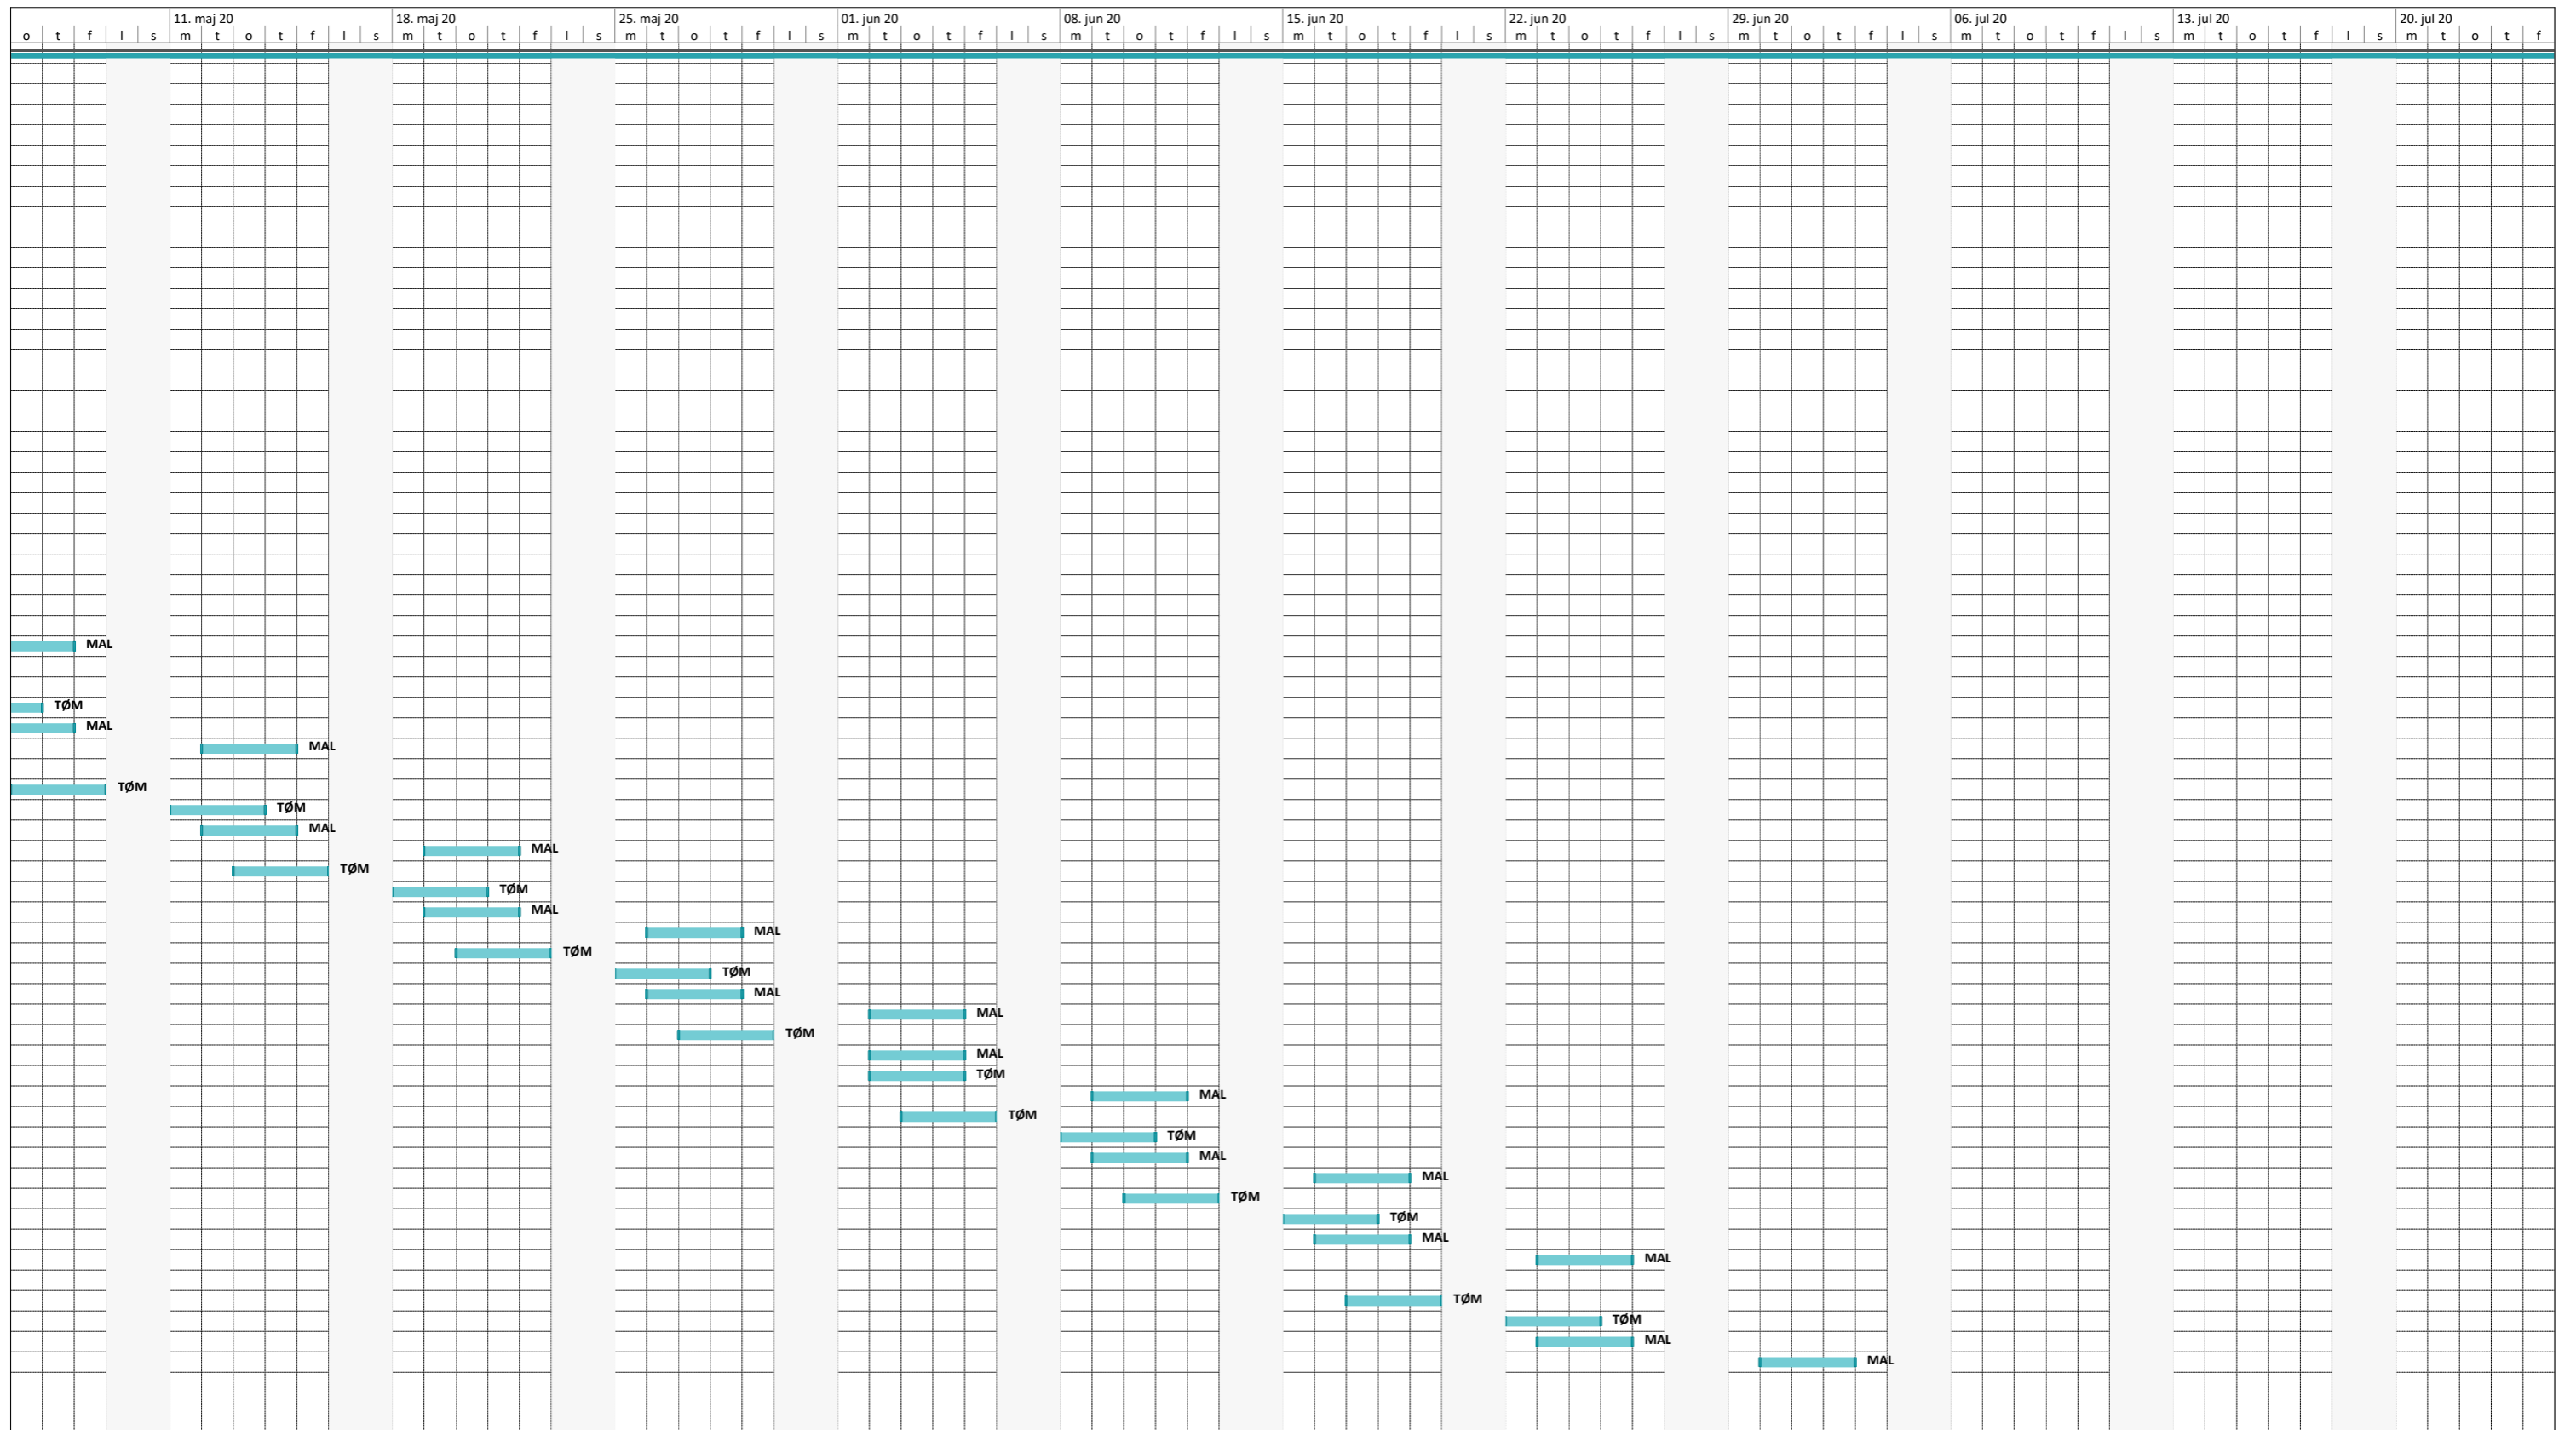

|  |          |  |                  |  |                 |  |                  |  |                            |  |              |  |               |
|--|----------|--|------------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|---------------|
| Projekt: Tidspjan - Døre - 230320<br>Dato: ma 23-03-20 | Opgave   |  | Hovedopgave      |  | Ekstern milepæl |  | Inaktiv oversigt |  | Manuel oversigtsopløftning |  | Kun slutdato |  | Manuel status |
|  | Opdeling |  | Projektoversigt  |  | Inaktiv opgave  |  | Manuel opgave    |  | Manuel oversigt            |  | Deadline     |  |               |
|  | Milepæl  |  | Eksterne opgaver |  | Inaktiv milepæl |  | Kun varighed     |  | kun start                  |  | Fremdrift    |  |               |
