Id	Opgavenavn	Faggruppe	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Aladdin - dørudskiftning**		**105 dage**	**ma 09-03-20**	**fr 31-07-20**
2	Udskiftning af døre BRO11	TØM	3 dage	ma 09-03-20	on 11-03-20
3	Malerarbejde BRO11	MAL	2 dage	ma 16-03-20	ti 17-03-20
4					
5	Udskiftning af døre BUR01	TØM	3 dage	on 11-03-20	fr 13-03-20
6	Udskiftning af døre BUR03	TØM	3 dage	ma 16-03-20	on 18-03-20
7	Malerarbejde BUR01	MAL	3 dage	ma 16-03-20	on 18-03-20
8	Malerarbejde BUR03	MAL	3 dage	ti 24-03-20	to 26-03-20
9	Udskiftning af døre BUR05	TØM	3 dage	on 18-03-20	fr 20-03-20
10	Udskiftning af døre BUR07	TØM	3 dage	ma 23-03-20	on 25-03-20
11	Malerarbejde BUR05	MAL	3 dage	ti 24-03-20	to 26-03-20
12	Malerarbejde BUR07	MAL	3 dage	ti 31-03-20	to 02-04-20
13	Udskiftning af døre BUR09	TØM	3 dage	on 25-03-20	fr 27-03-20
14	Udskiftning af døre BUR11	TØM	3 dage	ma 30-03-20	on 01-04-20
15	Malerarbejde BUR09	MAL	3 dage	ti 31-03-20	to 02-04-20
16	Malerarbejde BUR11	MAL	2 dage	ti 14-04-20	on 15-04-20
17	Udskiftning af døre BUR15	TØM	3 dage	on 01-04-20	fr 03-04-20
18	Malerarbejde BUR15	MAL	2 dage	ti 14-04-20	on 15-04-20
19	Udskiftning af døre BUR17	TØM	3 dage	ma 06-04-20	on 08-04-20
20	Udskiftning af døre BUR19	TØM	3 dage	ti 14-04-20	to 16-04-20
21	Malerarbejde BUR17	MAL	3 dage	ti 28-04-20	to 30-04-20
22	Malerarbejde BUR19	MAL	3 dage	ti 28-04-20	to 30-04-20
23	Udskiftning af døre BUR21	TØM	3 dage	on 15-04-20	fr 17-04-20
24	Udskiftning af døre BUR23	TØM	3 dage	ma 20-04-20	on 22-04-20
25	Malerarbejde BUR21	MAL	4 dage	ti 05-05-20	fr 08-05-20
26	Malerarbejde BUR23	MAL	3 dage	ti 05-05-20	to 07-05-20
27	Udskiftning af døre BUR25	TØM	3 dage	on 22-04-20	fr 24-04-20
28	Udskiftning af døre BUR27	TØM	3 dage	ti 28-04-20	to 30-04-20
29	Malerarbejde BUR25	MAL	3 dage	ti 12-05-20	to 14-05-20
30	Malerarbejde BUR27	MAL	3 dage	ti 12-05-20	to 14-05-20
31					
32	Udskiftning af døre BOD10	TØM	3 dage	on 29-04-20	fr 01-05-20
33	Udskiftning af døre BOD08	TØM	3 dage	ma 04-05-20	on 06-05-20
34	Malerarbejde BOD10	MAL	3 dage	ti 19-05-20	to 21-05-20
35	Malerarbejde BOD08	MAL	3 dage	ti 19-05-20	to 21-05-20
36					
37	Udskiftning af døre AND28	TØM	3 dage	on 06-05-20	fr 08-05-20
38	Udskiftning af døre AND26	TØM	3 dage	ma 11-05-20	on 13-05-20
39	Malerarbejde AND28	MAL	3 dage	ti 26-05-20	to 28-05-20
40	Malerarbejde AND26	MAL	3 dage	ti 26-05-20	to 28-05-20
41	Udskiftning af døre AND24	TØM	3 dage	on 13-05-20	fr 15-05-20
42	Udskiftning af døre AND22	TØM	3 dage	ma 18-05-20	on 20-05-20
43	Malerarbejde AND24	MAL	3 dage	ti 02-06-20	to 04-06-20
44	Malerarbejde AND22	MAL	3 dage	ti 02-06-20	to 04-06-20
45	Udskiftning af døre AND20	TØM	3 dage	on 20-05-20	fr 22-05-20
46	Udskriftning af døre AND18	TØM	3 dage	ma 25-05-20	on 27-05-20
47	Malerarbejde AND20	MAL	3 dage	ti 09-06-20	to 11-06-20
48	Malerarbejde AND18	MAL	3 dage	ti 09-06-20	to 11-06-20
49	Udskiftning af døre AND16	TØM	3 dage	on 27-05-20	fr 29-05-20
50	Malerarbejde AND 16	MAL	3 dage	ti 16-06-20	to 18-06-20
51	Udskftning af døre AND10	TØM	3 dage	ti 02-06-20	to 04-06-20
52	Malerarbejde AND10	MAL	3 dage	ti 16-06-20	to 18-06-20
53	Udskiftning af døre AND08	TØM	3 dage	on 03-06-20	fr 05-06-20
54	Udskiftning af døre AND06	TØM	3 dage	ma 08-06-20	on 10-06-20
55	Malerarbejde AND08	MAL	3 dage	ti 23-06-20	to 25-06-20
56	Malerabrjede AND06	MAL	3 dage	ti 23-06-20	to 25-06-20
57	Udskiftning af døre AND04	TØM	3 dage	on 10-06-20	fr 12-06-20
58	Udskfitning af døre AND02	TØM	3 dage	ma 15-06-20	on 17-06-20
59	Malerarbejde AND04	MAL	3 dage	ti 30-06-20	to 02-07-20
60	Malerarbejde AND02	MAL	3 dage	ti 30-06-20	to 02-07-20
61					
62	Udskiftning af døre BRO07	TØM	3 dage	on 17-06-20	fr 19-06-20
63	Udskftning af døre BRO09	TØM	3 dage	ma 22-06-20	on 24-06-20
64	Malerarbejde BRO07	MAL	3 dage	ti 07-07-20	to 09-07-20
65	Malerarbejde BRO09	MAL	3 dage	ti 07-07-20	to 09-07-20
66	Der er afsat 4 uger extra i tidsplanen så afleveringsforretningen først er	Bygherre	1 dag	ma 27-07-20	ma 27-07-20

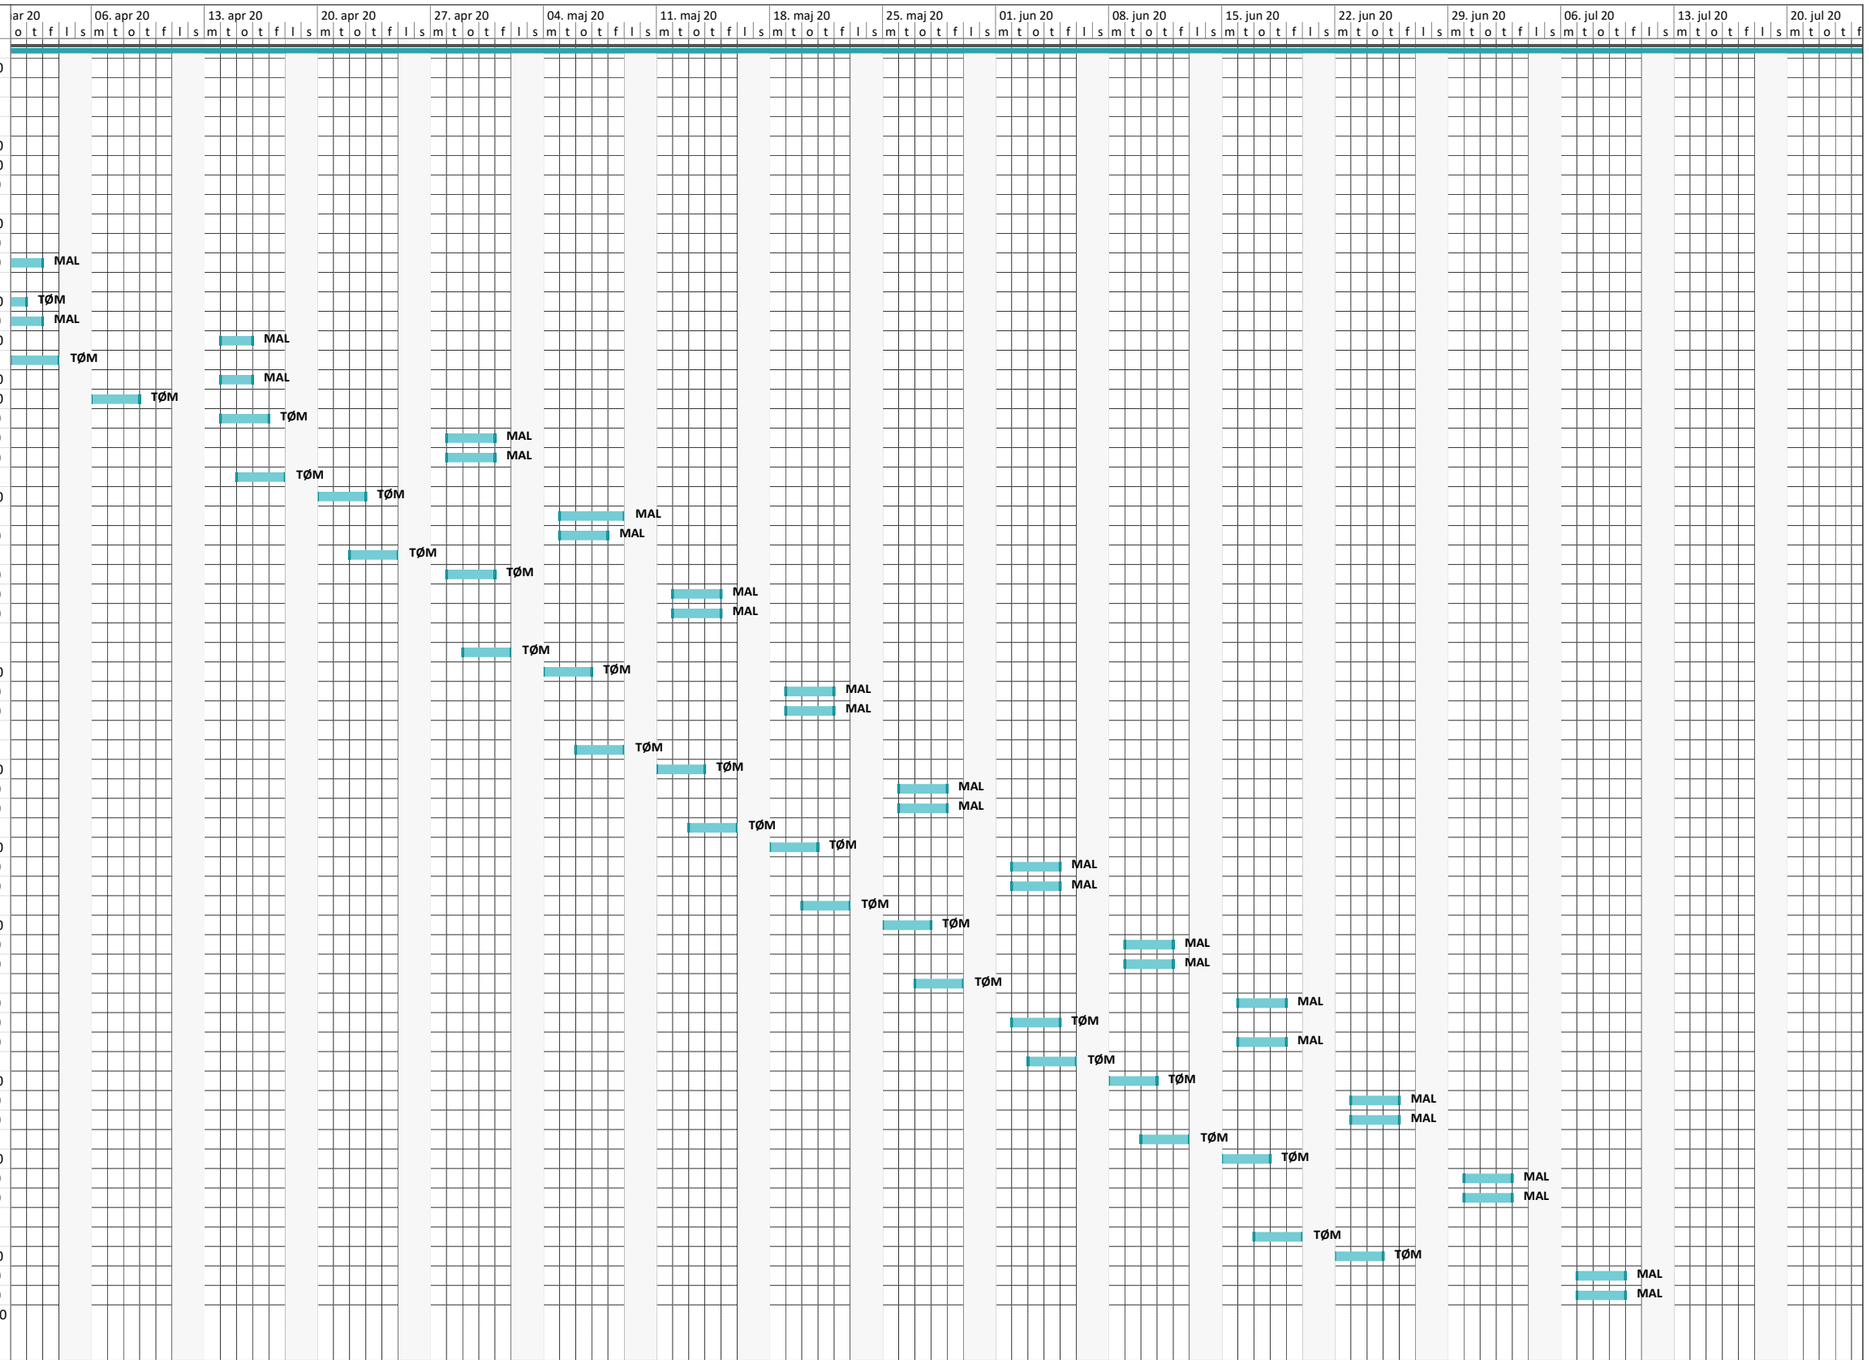

Projekt: Tidsplan - Døre - 010420
Dato: on 01-04-20

Opgave · Opdeling · Milepæl · Hovedopgave · Projektoversigt · Eksterne opgaver · Ekstern milepæl · Inaktiv opgave · Inaktiv milepæl · Inaktiv oversigt · Manuel opgave · Kun varighed · Manuel oversigtsopløftning · Manuel oversigt · kun start · Kun slutdato · Deadline · Fremdrift · Manuel status
